

### PLANO DE TRABALHO

#### 1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Clube Cultural Fica Ahí Pra Ir Dizendo		C.N.P.J. 87443164/0001-71	
Endereço Rua Marechal Deodoro 368			
Cidade Pelotas	U.F.RS	C.E.P. 96020-220	DDD/Telefone
Conta corrente 54981-8	Banco 748 Sicredi	Agência 0663	Praça de Pagamento Pelotas, RS
Nome do Responsável Teresa Joaquina Gomes Costa		C.P.F. [REDACTED]	
C.I./Órgão Expedidor	Cargo Presidente	Função	
Endereço [REDACTED]		C.E.P. 96025-040	
Home Page:		e-mail: [REDACTED]	


#### 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Revitalização - Fica Ahí	Janeiro/25	Junho/25
<b>Identificação do Objeto</b>  Marco da história e cultura negra da cidade de Pelotas e do estado do Rio Grande do Sul, o Clube Cultural Fica Ahí Pra Ir Dizendo está hoje em sua terceira sede, a qual se encontra danificada principalmente pela ação do tempo. Lar de atividades culturais diversas desde sua fundação, como bailes de carnaval, concursos de beleza, bailes de debutantes, encontros, palestras, oficinas e apresentações artísticas, entre vários outros tipos de eventos, o Clube se mantém, firme e forte, apesar das dificuldades, como um Quilombo Urbano, aberto para receber a comunidade pelotense.		

Justificativa da Proposição

Fundado em 1921, o Clube está hoje em sua terceira sede, a qual se encontra danificada principalmente pela ação do tempo.

Para realizar suas atividades e oferecer um ambiente adequado e confortável para seus frequentadores, a Diretoria do Clube vê necessária a realização de obras de revitalização na parte externa (pintura, limpeza) e principalmente na parte interna (ambiente térreo, salão principal, escadas, rede elétrica, etc). Assim sendo, o Clube, através da pessoa de sua Presidente e demais diretores, solicita a liberação financeira para dar início ao projeto de Revitalização da Sede da entidade, localizada à rua Marechal Deodoro, 368.

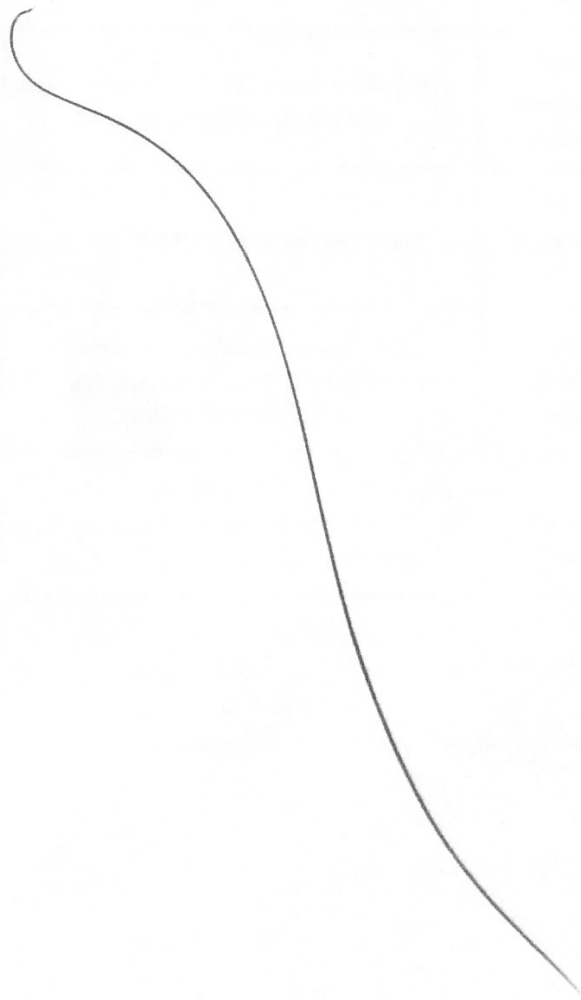

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Especificação	Data	
		Início	Término
ETAPAS	ATIVIDADES		
1 Atualização do PPCI (Plano de Proteção Contra Incêndio)	Obras necessárias para a liberação do PPCI, tais como rampas de acesso, conserto de portas para saídas de emergência, conserto de escadas, recarga de extintores, conserto em corrimãos, barras de pânico, rampas de acesso, etc.	Assim que a emenda for liberada	30 dias após o início
2 Conserto do telhado	Conserto de goteiras e infiltrações.	Assim que a emenda for liberada	7 dias após o início
3 Pintura da fachada do prédio	Pintura e revitalização da fachada do Clube.	Assim que a emenda for liberada.	15 dias após o início
4 Reforma na Copa	Aplicação de revestimento no balcão da copa e reboco da parede.	Após o conserto do telhado	3 dias após o início
5 Pintura do salão principal do Clube	Pintura e revitalização do salão.	Após o conserto do telhado	15 dias após o início
6 Conserto do assoalho do palco e das partes que necessitam de reparo no salão superior	Trocar tábuas danificadas pelo tempo, lixar e aplicar produtos para maior durabilidade.	Após o conserto do telhado	7 dias após o início
7 Aquisição de bens necessários para a secretaria e biblioteca do Clube.	Aquisição de mesas, cadeiras, 2 computadores, impressora, prateleiras para os livros, ar condicionado.	Assim que a emenda for liberada	40 dias após o início
8 Início da reforma do primeiro piso do Clube.	Colocação de piso onde for necessário, pintura, troca de ferro, reforma na rede elétrica, limpeza.		

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa						
	Especificação	Quant.	Unid.	Dias	Valor Un.	Total:
1	Atualização do PPCI (Plano de Proteção Contra Incêndio)	1	1	30	6.000	6.000
2	Conserto do telhado	1	1	7	7.000	7.000
3	Pintura da fachada do prédio	1	1	15	7.000	7.000
4	Reforma na Copa	1	1	3	3.000	3.000
5	Pintura do salão principal do Clube	1	1	15	8.000	8.000
6	Conserto do assoalho do palco e das partes que necessitam de reparo no salão superior	1	1	7	5.000	5.000
7	Aquisição de bens necessários para a secretaria e biblioteca do Clube.	1	1	15	30.000	30.000
8	Início da reforma do primeiro piso do Clube.	1	1	90	144.000	144.000
<b>SALDO TOTAL</b>						200.000

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Data:	Valor:
Assim que a emenda for liberada	R\$ 66.000,00
30 dias após a emenda for liberada	R\$ 72.000,00
60 dias após a emenda for liberada	R\$ 72.000,00
	Valor Total: R\$200.000,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL		

6 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Prefeitura de Pelotas para os feitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Termo de Parceria não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Valor de R\$ 200.000,00.

3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Pelotas, 19 de dezembro de 2024.

Local e Data

*Teresa Joaquina Gomes Costa*

Proponente

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Relatos, 20/12/2024

Local e Data



Concedente
